STADT AARAU	

Modulbau Tagesschule Baustart






Ablauf

- Begrüssung
- Baustart
- Terminprogramm
- Baumschutz und Fassadenmuster
- Fragen
- Apéro



- Baustart30. Sept. 2024
- Veloumleitung grün
- ZugangAareschulhausblau

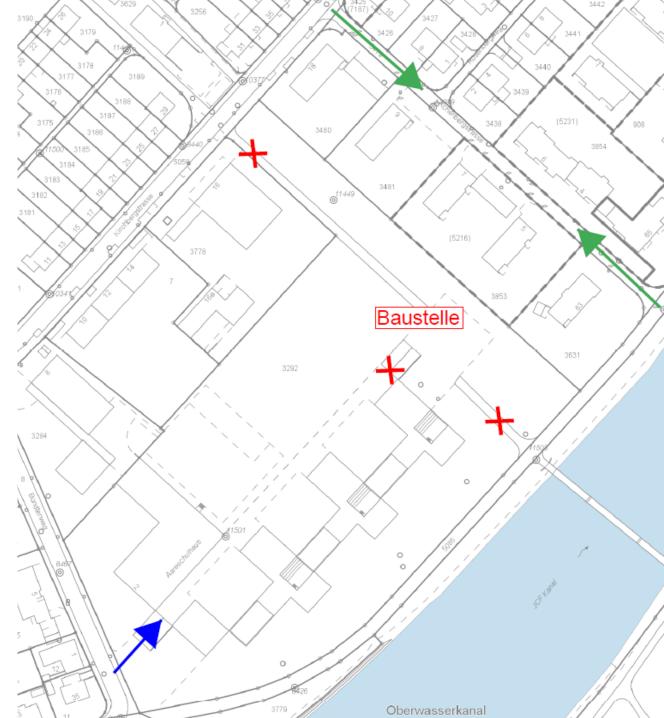



Terminprogramm

Baustart: 30. September 2024


Nov./Dez. 2024: Fundamentarbeiten

Februar/März 2025: Aufrichten Modulbau

März bis Juli 2025: Innenausbau

– März bis Juli 2025: Umgebung

Schulstart: 11. August 2025

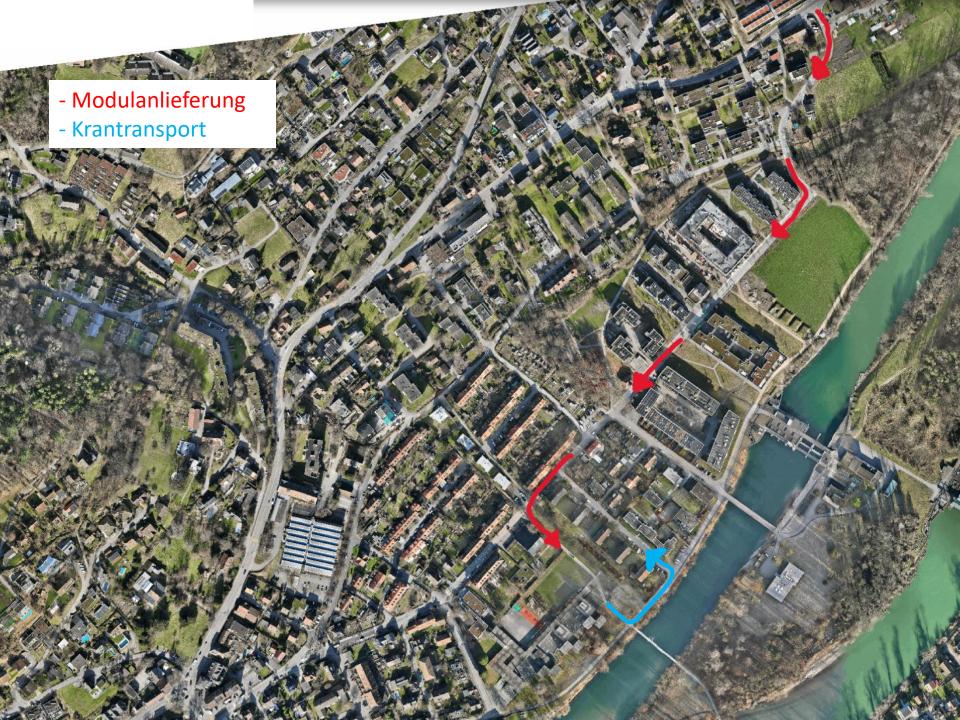








Baumschutz
















Fassadenmuster

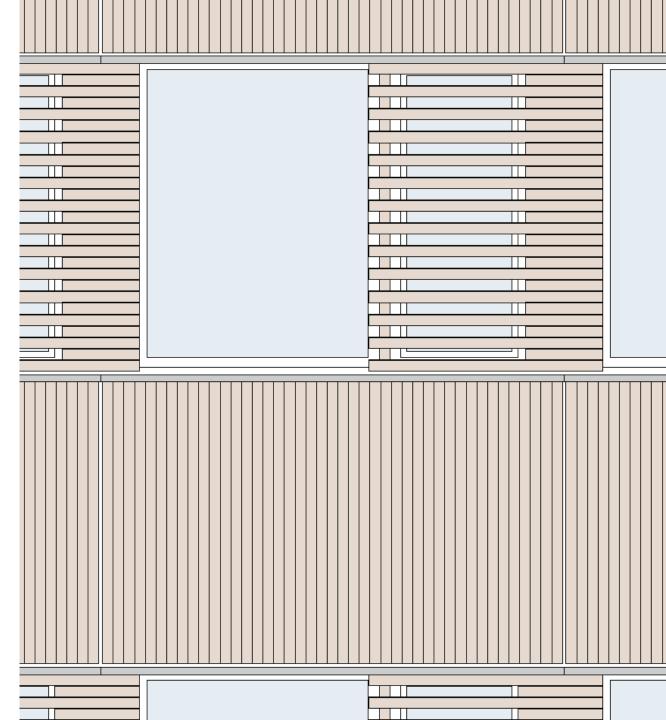





Apéro

